

## Términos de Referencia (TdR)

### EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO:

**“CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN I.E. PRIMARIA N°  
10915 EN LA COMUNIDAD DE CUNDIN - QUEROCOTO -  
CHOTA - CAJAMARCA”**



Recibido  
09-31.  
05/06/24

ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA  
L.E. JORGE LUIS CASTILLO LLONCOR  
ESPECIALISTA DE LOGISTICA Y CONTRATACIONES

**Querocoto, enero de 2024**

ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA  
Ing. GIBRANHIS DWIGHT JAZAN ALIAGA  
COORDINADOR DE PROYECTOS

1

**CONTENIDO**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO.....  | 3  |
| 2.  | FINALIDAD PÚBLICA.....  | 3  |
| 3.  | ENTIDAD CONVOCANTE.....   | 3  |
| 4.  | ANTECEDENTES.....   | 3  |
| 5.  | OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.....  | 3  |
| 6.  | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.....  | 4  |
| 7.  | UBICACIÓN DEL PROYECTO.....   | 4  |
| 8.  | ACCESSIBILIDAD.....   | 5  |
| 9.  | BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS.....   | 5  |
| 10. | PLAZO DE EJECUCIÓN.....   | 6  |
| 11. | INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.....  | 6  |
| 12. | ALCANCES DEL PROYETO.....   | 6  |
| 13. | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.....                                  | 6  |
| 14. | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.....   | 8  |
| 15. | FINANCIAMIENTO.....   | 9  |
| 16. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN.....   | 9  |
| 17. | SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....  | 9  |
| 18. | VALOR REFERENCIAL.....  | 10 |
| 19. | FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DE PAGO.....                                      | 10 |
| 20. | VALORIZACIONES.....   | 10 |
| 21. | FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.....                                      | 11 |
| 22. | LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.....  | 11 |
| 23. | REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR.....  | 11 |
| 24. | PERFIL DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE.....   | 11 |
| 25. | EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO.....  | 12 |
| 26. | DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES.....  | 13 |
| 27. | DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO..... | 13 |
| 28. | COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.....                                  | 13 |
| 29. | GESTION DE RIESGOS.....   | 13 |
| 30. | CUADERNO DE OBRA.....   | 14 |
| 31. | REAJUSTES.....  | 14 |
| 32. | RECEPCIÓN DE OBRA.....  | 14 |
| 33. | GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA.....   | 15 |
| 34. | GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.....  | 15 |
| 35. | VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA.....                              | 15 |
| 36. | RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES.....                             | 16 |
| 37. | SUB CONTRATA DE ACTIVIDADES.....  | 16 |
| 38. | PENALIDADES.....  | 16 |
| 39. | NORMAS ANTICORRUPCIÓN.....  | 19 |
| 40. | NORMAS ANTISOBORNO.....   | 19 |
| 41. | CONFIDENCIALIDAD.....   | 19 |



## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

"CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN I.E. PRIMARIA N° 10915 EN LA COMUNIDAD DE CUNDIN - QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA"

### 2. FINALIDAD PÚBLICA

Estructurar las bases para la realización de un proceso de adjudicación adecuado, dando oportunidad a potenciales postores de la zona y de la región, aplicando todos los principios que rigen las contrataciones, con el propósito de obtener una propuesta con calidad de servicio, para lograr al final que se cumplan todas las especificaciones y términos establecidos en el Expediente Técnico, en el desarrollo de la ejecución de la obra, todo ello con el único propósito de cumplir con las expectativas y dar a conocer la transparencia con que se realizan los procesos de selección

### 3. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL LA GRANJA (AFSLG)  
RUC N°: 20491601788  
Domicilio legal: Calle Comercio N° 365-Querocoto- Chota

### 4. ANTECEDENTES

- ✓ "LA ASOCIACIÓN", se constituye mediante Escritura Pública de fecha 29 de diciembre del 2008, cuyo objetivo principal es la gestión y administración de los recursos provenientes del proceso de privatización del Proyecto La Granja transferido a Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. (RTMP), destinado por el Estado Peruano a través de PROINVERSIÓN, para la implementación de proyectos de inversión social en el área de influencia directa del Proyecto La Granja. Los asociados de "LA ASOCIACIÓN", son RTMP, la Municipalidad Distrital de Querocoto (MDQ), la Municipalidad del Centro Poblado La Granja y la Municipalidad del Centro Poblado Paraguay.
- ✓ La obra "Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Primaria N° 10915 de La Localidad de Cundín, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca", inicio el 19/05/2021 y finalizo el 19/03/2022
- ✓ Mediante Resolución Gerencial N° 003-2022-AFSLG/GG se aprueba la liquidación técnica financiera de la obra "Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Primaria N° 10915 de La Localidad de Cundín, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca"
- ✓ Con fecha del 29/03/23 la directora, docentes y padres de familia de la IE. 10915 de Cundín, solicitan a defensa civil pueda realizar una inspección técnica a la rampa de acceso a la institución.
- ✓ Con fecha del 08/05/23 mediante informe 163-MDQ/ELE/SGIDUR la Municipalidad Distrital de Querocoto, remite informe de inspección técnica de la I.E. 10915-CUNDÍN, en el cual concluyen, que los agrietamientos de la infraestructura descritos en las fotografías han sido producto de las actividades meteorológicas y las inclemencias del tiempo, que han provocado el movimiento de masas de suelo, consecuencia de ello se ha visto afectada la infraestructura, quedando en condición riesgosa.



### 5. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto seleccionar a la persona natural o jurídica

Calle Comercio N° 365 – Querocoto

SOCIA... FONDO SOCIAL LA GRANJA  
Ing. GHEINIMB DWIGHT BAZAN ALLAGA  
COORDINADOR DE PROYECTOS

3

que preste los servicios de ejecución de obra del proyecto denominado “Creación de muro de contención I.E. Primaria N° 10915 en la comunidad de Cundin - Querocoto - Chota - Cajamarca”

Este documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplirse en la ejecución de la obra materia del presente requerimiento, así mismo establecer las condiciones que debe cumplir el contratista a cargo de la ejecución de la obra, dichas condiciones estarán basadas en los parámetros de capacidad técnica, logística, legal, financiera y de eficiencia en cumplimiento de la garantía mínima requerida.

**6. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

Contratar los servicios de ejecución de obra del proyecto denominado “Creación de muro de contención I.E. Primaria N° 10915 en la comunidad de Cundin - Querocoto - Chota - Cajamarca”

**7. UBICACIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Cundín, Centro Poblado Paraguay, Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región Cajamarca.

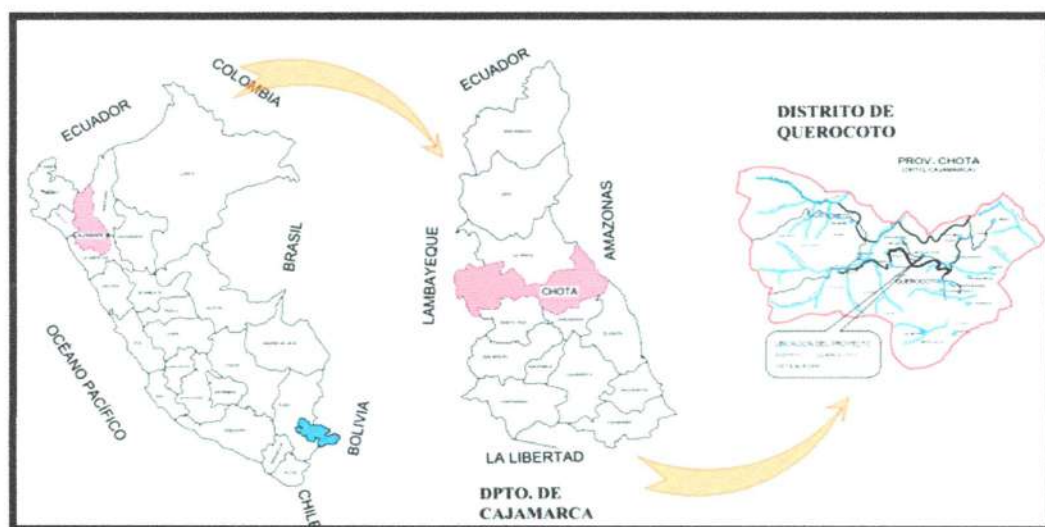


Imagen N° 01: Ubicación geográfica del Querocoto



Imagen N° 02: Ubicación del área del proyecto



**8. ACCESSIBILIDAD**

El acceso hacia el caserío de Cundín se efectúa desde la ciudad de mediante una carretera afirmada

**ACCESO AL ÁREA DE INFLUENCIA**

| CARRETERA                  | DISTANCIA (KM) | TIEMPO (horas) |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Chota – El Cruce (Huambos) | 58.10          | 1 h 20 min     |
| El Cruce - Querocoto       | 40.30          | 1 hora         |
| Querocoto – Cundín         | 15.5           | 40 min         |

**9. BASE LEGAL, NORMAS Y REGLAMENTOS**

- Constitución Política del Perú
- Código Civil Peruano
- Decreto Legislativo N° 996.
- Decreto Supremo N° 082-2008-EF que aprueba el Reglamento del D.L. N. 996 y su modificatoria D.S. N° 238-2016-EF.
- Estatuto de la Asociación Fondo Social La Granja.
- Reglamento de Contrataciones de la AFSLG vigente.

- Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Norma Técnica de Metrados.
- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud, del 20/07/97. Artículo 104° y 107°
- Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 442 Creación del Instituto Nacional de Defensa Civil
- D.S. N° 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil
- Reglamento nacional de edificaciones.
- Ley N° 28044 Ley General de la Educación.
- Ley N° 26549 Ley de los Centros Educativos Privados
- Norma técnica "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa" con R.V.M. N° 010-2022-MINEDU
- Toda norma o ley aplicable al sector objeto de la contratación

#### 10. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de sesenta (60) días calendarios (Incluye días hábiles, feriados y días no laborables), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del "Acta de Inicio", previa notificación de orden de servicio y/o firma de contrato.

#### 11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

La AFSLG, el contratista y la supervisión (las partes) establecerán la fecha de inicio del plazo para la ejecución de la obra, para lo cual las partes suscribirán un "Acta de Inicio" para la prestación del servicio por parte del contratista dentro de los diez (10) días calendarios de suscrito el contrato y/o orden de servicio.

Para ello la AFSLG, a través del área Logística y Contrataciones, notificara mediante soporte papel o electrónico al postor ganador al que se adjudicó la ejecución de la obra, con la finalidad de indicarle el día para la suscripción del "Acta de Inicio" de prestación del servicio.

El "Acta de inicio" será suscrito entre: la Gerencia de la AFLG, Coordinador de Proyectos de la AFSLG, el Especialista de Logística y Contrataciones de la AFSLG, el Supervisor de la Obra, El Contratista y El Residente de la ejecución de la obra



#### 12. ALCANCES DEL PROYETO

El proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de concreto armado, para poder brindar soporte y estabilidad a las estructuras cercanas de la I.E. 10915 – Cundin, y al acceso a dicha institución, se ha proyectado las siguientes estructuras:

- Demolición de losa y pórtico principal.
- Muros de Contención de concreto armado en 39 m.
- Creación del Pórtico de Ingreso.
- Plataforma de Ingreso en 130.60 m2.
- Cerco de malla galvanizada L=39 m.

#### 13. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete a brindar todas las facilidades y atender los requerimientos de control de calidad: Inspecciones y pruebas requeridas por el supervisor y/o cualquier otro profesional que designe la Gerencia General de la AFSLG.

##### 13.1 Actividades previas a la ejecución de la obra

- ✓ **Entrega de terreno**
  - Delimitación del área de trabajo
  - Suscripción del acta de entrega de terreno
  - Suscripción del acta de inicio
  - Otros
- ✓ **Apertura y legalización de cuaderno de obra**
- ✓ **Revisión del expediente técnico**
  - Revisión de la ingeniería Básica
  - Revisión de la ingeniería de detalle
  - Informe de revisión del expediente técnico
  - Otros.

### 13.2 Actividades durante la ejecución de obra

- ✓ **Control de calidad de la Obra**
  - Evaluación de los procesos constructivos
  - Revisión de las instalaciones, equipos, materiales y persona.
  - Garantizar durante la ejecución, el suministro de equipos de protección personal al personal que participa de la ejecución de obra
- ✓ **Control técnico de la Obra**
  - Cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente técnico
  - Cumplimiento de las normas y manuales técnicos
  - Realización de pruebas de control de calidad de los materiales
  - Control de pruebas de campo, ensayos de laboratorio
- ✓ **Control de avance de la obra**
  - Presentación de informes y valorizaciones mensuales
- ✓ **Control de medio ambiente**
  - Eliminación de material excedente
  - Control de agentes contaminantes
  - Limpieza de obra
- ✓ **Control de seguridad**
  - Demarcación y aislamiento del área de trabajo
  - Almacenamiento de materiales
  - Control de accidentes de obra
  - Charlas de seguridad al personal de obra
- ✓ **Otras actividades**
  - Constatar el replanteo general de la obra, asimismo, los niveles planteados en los planos correspondiente según expediente técnico.
  - Ejecutar pruebas y ensayos que se soliciten, realizadas por la Supervisión
  - Valorizar mensualmente la obra ejecutada según presupuesto de obra, sustentándola con la documentación técnico – administrativa que lo respalde




### 13.3 Actividades de recepción de obra, liquidación de contrato e informe final

- ✓ **Previa recepción de obra**
  - Comunicación de solicitud de obra a la supervisión
  - Presentar el informe situacional de la obra
  - Solicitar fecha para recepción de obra
- ✓ **Durante la recepción de obra**
  - Suscripción de acta de observaciones o el acta de recepción de obra
  - Levantamiento de las observaciones, de ser el caso
  - Recepción final de obra
- ✓ **Liquidación de obra**
  - Elaboración de la liquidación final de obra
  - Pagos de AFP u ONP, Essalud y formatos PDT 601
  - Certificado de no adeudos a terceros, presentando declaración jurada de los mismos, firmadas por las autoridades locales.
- ✓ **Presentar informe final de obra**

#### 14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- a) El contratista será responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar por la calidad de la obra.
- b) El contratista será responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de obra y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.
- c) Es responsabilidad del contratista el cumplimiento de los cronogramas de avance de obra.
- d) El contratista es responsable el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
- e) El contratista es responsable de entregar y tener vigente la carta fianza de fiel cumplimiento o adelantos, en caso corresponda, deberá ser comunicando a la AFSLG a través del ingeniero supervisor, con la debida antelación. Dichas cartas fianzas serán incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, a sólo requerimiento de la AFSLG.
- f) El contratista, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar será civil y legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra por el periodo de siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.
- g) El contratista será responsable de la calidad de la obra, realizando las pruebas y protocolos de control requeridas.
- h) El contratista es responsable de realizar los pagos, tributos, licencias, seguros y beneficios del personal contratado para la ejecución de la obra (independientemente de ser trabajadores eventuales, temporales o permanentes), sin responsabilidad de la AFSLG.
- i) El contratista deberá cumplir con el personal ofertado que esté a su cargo y cuente con los equipos de protección personal y herramientas adecuadas para el trabajo
- j) El contratista deberá contar con su personal clave ofertado para que pueda iniciar las actividades, caso contrario será penalizado
- k) El contratista se compromete a contratar mano de obra no calificada al 100% de la zona de influencia, con énfasis en la localidad donde se realiza la obra.
- l) El contratista se compromete a dar énfasis a la proveeduría local en cuanto a compras y adquisiciones, siempre que los insumos cumplan con las especificaciones técnicas, calidad mínima requerida y los precios estén acorde al mercado y respeten la libre competencia.





- m) El contratista deberá socializar todos los aspectos referentes a la ejecución del proyecto y sus distintas etapas, a fin de informar a las autoridades y población en general y esta pueda tener conocimiento pleno de las intervenciones que se harán en su comunidad, así como las molestias que estas puedan ocasionar (ruidos, polvo, manejo de desmonte, cierre de vías, etc.)
- n) El contratista se deberá regirse a los términos de confidencialidad especificados en el contrato. Entre ellos el contratista está prohibido de brindar información técnica adicional al expediente técnico a la comunidad, sin previa coordinación y consenso con la AFSLG.
- o) El contratista deberá informar anticipadamente a las autoridades y población en general respecto a la cantidad de mano de obra necesaria en sus distintas actividades y etapas del proyecto, así como los importes de pago que manejará en sus distintas actividades, especialmente lo concerniente al pago de mano de obra local.
- p) El contratista es responsable de velar por el mantenimiento del buen clima social entre todos sus trabajadores y la población en general, así como el respeto a la cultura local.
- q) El contratista es responsable de promover la equidad de género, en el desarrollo de sus actividades
- r) Ante el cambio de cualquier personal clave, por fuerza mayor, que supere la responsabilidad del Contratista, este deberá informar el cambio de personal al ingeniero supervisor presentando el curriculum vitae de los nuevos candidatos, los cuales deben contar con perfiles técnicos iguales o superiores a los establecidos en las bases del concurso.
- s) El contratista está obligado a presentar los certificados que garanticen la calidad de los insumos que se compre para la ejecución de la obra, a las autoridades de la comunidad de La Palma, comité de vigilancia de la obra y/o a la supervisión de obra y/o a la AFSLG.
- t) El contratista y el personal clave antes de iniciar sus actividades pase por una inducción de aspectos técnicos de la obra, comunicación y Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) por parte de la AFSLG
- u) El contratista está prohibido de contratar a personal menor de 18 años y mayor de 65 años.
- v) El contratista podrá solicitar adicional de obra, siempre y cuando está reflejado en el informe de compatibilidad.
- w) El contratista no podrá ejecutar un adicional o deductivo de obra (mayores metrados, partidas nuevas, etc.) sin previa aprobación ingeniero supervisor y corroborado por la AFSLG.
- x) El contratista será responsable de reparar patrimonialmente todo tipo de daños causado a terceros, como resultado de la ejecución de la obra, sin que la AFSLG se vea obligada a pagar suma alguna o compensación u otra suerte de retribución a las personas dañadas.



#### 15. FINANCIAMIENTO

La obra será financiada por la AFSLG

#### 16. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por contrata

#### 17. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación será a suma alzada.

**18. VALOR REFERENCIAL**

El valor referencial es de **S/. 352,778.95 (Trescientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y ocho con 95/100 soles)** dicho valor referencial incluye gastos generales utilidades, todos los tributos, seguros, transporte inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, Además, deberá indicarse la incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos. Manteniéndose los planteados en el expediente técnico, con lo cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obra por parte del contratista

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>     | <b>259,969.75</b> |
| GASTOS GENERALES (10%)   | 25,996.98         |
| UTILIDAD (5%)            | 12,998.49         |
| =====                    | -----             |
| <b>SUB TOTAL</b>         | <b>298,965.21</b> |
| IGV (18 %)               | 53,813.74         |
| =====                    | -----             |
| <b>VALOR REFERENCIAL</b> | <b>352,778.95</b> |

**19. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DE PAGO**

Se pagará en periodos mensuales previa presentación de la valorización de obra, indicando el avance correspondiente al periodo acorde al cronograma de avance físico indicado en el expediente técnico, la misma que debe ser aprobada por el ingeniero supervisor de obra y el Coordinador de Proyectos de la AFSLG. Las valorizaciones se deberán presentar máximo hasta el quinto día hábil del mes siguiente.

El tiempo para la revisión y aprobación de las valorizaciones por parte de la oficina del Coordinador de Proyectos de la AFSLG será de 15 días calendarios. Juntamente a la valorización se presentará la factura correspondiente de acuerdo a lo indicado por la unidad de Logística y Contrataciones de la AFSLG

La AFSLG hará efectivo el pago de acuerdo a las valorizaciones presentadas, dentro del plazo de 20 días calendarios de haberse aprobado la valorización presentada.

El trámite de pago de la última valorización estará sujeta a la presentación de los documentos de no adeudo firmadas por las autoridades locales del ámbito del proyecto u obra o servicio, además legalizados por el Juez de Paz del Distrito de Querocoto.

**20. VALORIZACIONES**

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas por el contratista el último día de cada periodo y aprobadas y revisadas por el ingeniero supervisor, según corresponda.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realiza a quien se indique en el contrato del consorcio

En la valorización debe anexar las evidencias de pago a personal calificado y no calificado así mismo de la compra del SCTR-Salud y SCTR-Pensión



## 21. FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos serán presentados de la siguiente forma:

- Forma física: Documento impreso (01 original + 01 copia)
- Forma digital: (01 USB que contenga): Documento escaneado en PDF, Editable en Word y las Tablas de cálculo Excel, CAD y/o otros.

## 22. LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, desde el día siguiente a la suscripción del acta de entrega y recepción de obra

Luego esta será revisada y aprobada por el Supervisor y/o Inspector de obra, para que finalmente sea presentada por este a la AFSLG para su revisión y aprobación mediante resolución

## 23. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR

El postor podrá participar en forma individual o en consorcio, debe contar con ficha RUC ACTIVO y HABIDO donde se especifique la actividad principal relacionada al objeto de contratación y otros requisitos considerados en las bases del proceso.

El postor deberá contar con experiencia general igual o mayor a dos veces (2) veces el valor referencial de obra en ejecución de obras y experiencia especifica una (1) vez el valor referencial de obra en la ejecución de obras similares. La acreditación del monto facturado acumulado será durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de presentación de las ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

### Acreditación

Copia simple de contratos, resolución de liquidación de obra, documento de conformidad de obra; y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. Debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Para acreditar experiencia en obras privadas, además de lo señalado anteriormente, el postor deberá presentar facturas con su respectivo comprobante de pago (Boucher y/o estado de cuenta) y depósito de detracción (SPOT — SUNAT).

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo

## 24. PERFIL DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE

En Relación al personal clave requerido se solicitan de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y en razón de las funciones y actividades que dichos profesionales desarrollarán durante la ejecución de la obra y dada también la finalidad y complejidad de la misma.

Al personal profesional de acuerdo a sus cargos, estos deberán ser acordes a los cargos de las bases administrativas de los procesos de selección convocados y de los cuales formaron parte.

Se indica el perfil del personal clave para la ejecución de la obra.

| PERSONAL CLAVE      |  |   |   |
|---------------------|--|---|---|
| CARGO               | FORMACION ACADEMICA                                | TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO  | EXPERIENCIA / ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN   |
| Ingeniero Residente | Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y Habilitado   | Contar con un (01) años de experiencia específica y Con tres (03) años de experiencia general | Experiencia específica como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras Similares, que se computa desde la Colegiatura.   |
| Maestro de Obra     | Estudios secundarios, formación técnica o superior | Contar con un (01) años de experiencia específica y Con dos (02) años de experiencia general  | La experiencia específica se refiere a Obras similares al objeto de la convocatoria y la experiencia general a trabajos en obras de construcción (edificaciones, carreteras, canales, etc.) |

**Nota:** Todos los profesionales deberán presentar una declaración jurada de veracidad por la documentación que sustenta su profesión y experiencia

#### Acreditación

Se precisa que, tanto para los requerimientos técnicos mínimos y acreditar la experiencia será con copia simple de:

- Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;
- Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación;
- Constancias y/o certificado de trabajo
- Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente la prestación de dicho servicio.



#### 25. EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO

El contratista deberá contar con el equipamiento necesario para la ejecución de la obra, materia de la presente convocatoria de acuerdo con los cuadros siguientes:

| ITEM | EQUIPAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN                                | UNIDADES | CANTIDAD |
|------|---|----------|----------|
| 1    | MEZCLADORA DE CONCRETO. 9-11 P3                               | Und      | 1.00     |
| 2    | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP                           | Und      | 1.00     |
| 3    | MOTOŞOLDADORA DE 250 AMP.                                     | Und      | 1.00     |
| 4    | NIVEL   | Und      | 1.00     |
| 5    | VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP                                   | Und      | 1.00     |
| 6    | CAMIONETA PICK UP 4x4, doble cabina, antigüedad máxima 5 años | Und      | 1.00     |

#### Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Para el caso de compromisos de alquiler y compra venta, se deberán adjuntar documentos que acrediten la propiedad de los equipos, tales como aquellos autorizados por SUNAT (Facturas, boletas), contratos, leasing, tarjetas de propiedad o documentos registrales: así como también se adjuntara los originales de las cartas de compromiso de alquiler.

La definición de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados.

La antigüedad de los equipos no será mayor a los siete (7) años, para acreditar que el postor cuenta con el equipo mínimo, se presentará en formato libre (tiene carácter de declaración jurada), adjuntando copia de los documentos sustentatorios correspondientes, en los cuales se especifique las características, modelo y año de fabricación que determinen la antigüedad de los equipos. Para el caso de los equipos topográficos y balde hidráulico estos deben tener certificado de calibración vigente con un periodo no mayor a 12 meses.

El contratista presentará compromiso de relevar o reemplazar cualquier equipo que, por causas ajenas, experiencia no comprobada en la operación o defectos no solucionados en un plazo de 48 horas que atentan al avance y calidad de la ejecución de la obra bajo cuenta, costo y responsabilidad de éste liberando de toda responsabilidad y costos adicionales a la AFSLG.

#### 26. DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES

Para el postor y el personal propuesto se define como obras similares a las obras de construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o la combinación de alguno de los términos anteriores en la construcción de obras de infraestructura

#### 27. DOMICILIO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista deberá hacer llegar a la AFSLG el domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros para efecto de notificación durante la ejecución de la obra, con la finalidad de hacer fluida la comunicación respectiva.

Cabe recalcar que el correo electrónico declarado en la propuesta tiene similar validez legal para efectos de comunicación y/o notificación contractual.

#### 28. COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

Por parte del contratista, todo tipo de comunicación con la entidad contratante (AFSLG) lo harán a través de la Supervisión contratada por parte de la AFSLG

- ✓ Para consultas técnicas se deberá presentar el Residente de obra
- ✓ Para consultas contractuales se deberá presentar el representante legal de la empresa y/o consorcio adjudicado de la obra.
- ✓ Para consultas y/o coordinaciones referentes al proceso logístico y de contratación con el área de logística y contrataciones

#### 29. GESTION DE RIESGOS

El postor es responsable del 100% de los riesgos por accidentes que pueda ocurrir durante la prestación de sus servicios.

Es obligación y responsabilidad absoluta del contratista velar por la seguridad de sus trabajadores debiendo para ello:



- Proporcionar al Personal que trabajará en el servicio de todos sus equipos de seguridad personal (Cascos de seguridad, Zapatos de seguridad, Chaleco reflectivo, Polo y pantalón con cinta reflectiva, Guantes, lentes o máscaras de protección, etc.) según el tipo de trabajo o actividad a realizar.
- Equipos de protección colectiva (arneses, líneas de vida, etc.)
- Todo el personal que labore deberá contar con seguro contra todo riesgo (SCTR-Salud y SCTR-Pensión) conforme al Decreto Supremo 003-98-SA debiendo el contratista remitir las respectivas pólizas para poder tramitar el pago final de su contrato.

El responsable de SSOMA deberá contar con la siguiente documentación, misma que será solicitada durante la supervisión por parte del especialista de SSOMA de la AFSLG.

- Deberá tener registro de EPPS por puesto de trabajo.
- SCTR vigente.
- Registro de ATS, IPERC base
- Registro de charla de 5 minutos
- Registro de capacitaciones adicionales de ser necesario.

### 30. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a la AFSLG, Otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

El Cuaderno de obra contendrá toda la anotación referente al desarrollo de los trabajos. El uso y control de los materiales, el avance físico, consultas, absoluciones, registro de incidentes y/o accidentes en caso sucediera y modificaciones; éste permanecerá en obra y a disposición del personal técnico de la obra.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la AFSLG. Concluida la ejecución y recibida la obra. El original queda en poder de la AFSLG

El cuaderno de obra será verificado por cualquier persona que realice el monitoreo de campo parte de la AFSLG.

### 31. REAJUSTES

No se aplicarán reajustes, puesto que los costos han sido actualizados al mes de mayo de 2023.

### 32. RECEPCIÓN DE OBRA

A la terminación de la obra el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles posteriores a la anotación señalada, lo informa a la AFSLG, ratificando o no lo indicado por el ing. Residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe. En caso que el inspector o supervisor informe a

la AFSLG que la obra ha culminado, la AFSLG debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la comunicación de recepción de obra, el comité de recepción de obra programara la visita para la recepción de obra en un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios una vez conformado el comité de recepción de obra.

El comité de recepción, estará integrado por dos representantes de la AFSLG y como veedores el director(a), padres de familia y APAFA de la I.E. 10915, y/o autoridad del caserío de Cundín y CP Paraguay.

Un representante de la AFSLG deberá ser necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité.

Luego de una inspección conjunta entre los representantes del AFSLG, el supervisor y del contratista, si no surgen observaciones serias con relación a la calidad y terminación de la obra, se procederá a la recepción, suscribiendo el acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra.

De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones por el comité de Recepción, no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego.

### 33. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Según el Reglamento de Contrataciones de la AFSLG 2023 no corresponde.

### 34. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador de la buena pro, debe presentar una garantía de fiel cumplimiento a través de Carta Fianza Bancaria, que será equivalente al 10% del monto del contrato adjudicado. Con un tiempo de vigencia desde consentida la buena pro hasta la resolución de liquidación de la obra, debiendo ser renovado en caso de solicitud por la AFSLG.

La carta fianza deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la AFSLG, siempre y cuando hayan sido emitidas por una institución financiera, sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría Tipo A que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

### 35. VISITA A LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA

Es obligatorio que el participante realice una visita al lugar donde se ejecutará la obra, materia del presente proceso, de esta manera su propuesta técnica y económica se ajustará a la realidad prevista en el expediente técnico. No será motivo de ampliación presupuestal y plazo las condiciones climatológicas, geomorfológicas y transporte al lugar de la obra.

Es responsabilidad del postor adjuntar en su oferta una constancia de visita de obra firmada por mínimo 3 autoridades de las siguientes: alcalde delegado del CP Paraguay, presidente de Rondas de base, presidente de APAFA, directora de la I.E., teniente gobernador y Agente Municipal de Cundín; en caso de presentarse en consorcio serán presentadas por cada una de las empresas consorciadas.

El no presentar esta acta de visita de campo en su propuesta, quedara excluido del concurso público.

### 36. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Y LABORES

El Contratista es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven a partir de la ejecución del proyecto, hasta un periodo de siete (07) años contados a partir del Informe de conformidad otorgada por la entidad ejecutora AFSLG.

### 37. SUB CONTRATA DE ACTIVIDADES

La empresa ganadora queda imposibilitada de sub contratar la totalidad de trabajos a otra empresa para ejecutar las actividades para la ejecución de obra, siendo este causal para la cancelación del contrato.

### 38. PENALIDADES

Si la Empresa ejecutora de la obra incurre en retraso injustificado en la ejecución de la obra, se le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
  - b.1 Para bienes y servicios: F = 0.25
  - b.2 Para obras : F = 0.15

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando la empresa acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. El que el retraso se califique como justificable no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, la AFSLG puede resolver el contrato por incumplimiento.

- ✓ La AFSLG, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio del Consultor, podrá aplicar otras penalidades a parte de la penalidad por retraso injustificado, las que se detallan en la siguiente "Tabla de otras Penalidades", para cuyo porcentaje (%)

| TABLA DE OTRAS PENALIDADES |   |  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| N°                         | Sustento de aplicación de penalidad   | Forma de calculo   | Procedimientos  |
| 01                         | Quando el personal clave acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días. | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG |
| 02                         | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la AFSLG no haya aprobado la sustitución del personal por no  | 2/1000 del monto del contrato original, por cada día de                                    | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del                                      |





| TABLA DE OTRAS PENALIDADES |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| N°                         | Sustento de aplicación de penalidad  | Forma de calculo   | Procedimientos   |
|                            | cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.   | demora o retraso en la prestación.   | Coordinador de Proyectos de la AFSLG   |
| 03                         | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor de obras impidiéndole anotar las ocurrencias   | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 04                         | Cuando el contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos declarados o que los tenga incompletos para la ejecución de obra  | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 05                         | Plan de seguridad: No presentar dentro de los siete (7) días de iniciado el plazo de ejecución de obra, el Plan de Seguridad al ingeniero supervisor.  | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 06                         | Plazos para presentación de documentos: Por demora en la presentación de informes de valorizaciones, informes mensuales, informes de opinión de ampliación de plazo, informes referidos a prestaciones adicionales de obra, informe final, tomándose como referencia los plazos establecidos   | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 07                         | Seguridad de obra y señalización: Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas de acuerdo a la norma vigente. La multa diaria será de;   | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, Especialista SSOMA con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG |
| 08                         | Indumentaria e implementos de protección personal: Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por la AFSLG. Esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores y por el total del paquete de obras, La penalidad se aplicará a todo el contrato y será de manera diaria. | 2/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, Especialista SSOMA con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG |
| 09                         | Seguros SCTR: cuando el contratista no cuente con el seguro vigente SCTR de su personal según el ítem 26. GESTIÓN DE RIESGOS de los términos de referencia.  | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, Especialista SSOMA con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG |
| 10                         | Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra y/o no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y/o el contrato.  | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 11                         | Anotación de ocurrencias: Si el ingeniero residente de obra incumple en evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos y no realiza la anotación de los resultados en el Cuaderno de obra en el plazo establecido   | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en la prestación. | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                    |
| 12                         | Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización o verificación del ingeniero supervisor o de la AFSLG   | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de demora o retraso en                | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del   |



| TABLA DE OTRAS PENALIDADES |  |   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| N°                         | Sustento de aplicación de penalidad  | Forma de calculo  | Procedimientos  |
|                            |  | la prestación.  | Coordinador de Proyectos de la AFSLG  |
| 13                         | Calidad de ejecución de obras: Cuando el ingeniero supervisor observe un trabajo mal ejecutado, se aplicará una penalidad por ocurrencia, y además de dicha penalidad, el contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad.  | (5/1000) del monto del contrato original, por ocurrencia.       | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 14                         | Cronograma valorizado al inicio del plazo contractual: Cuando el Contratista no cumpla con presentar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas.  | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 15                         | Pruebas y ensayos: Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.  | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 16                         | Residente de obra: Cuando el ingeniero residente de la obra no se encuentra en forma permanente en la obra.  | 2/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 17                         | Permanencia del plantel técnico: En caso de que los profesionales del plantel técnico no permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participación y de acuerdo al calendario de participación del personal.  | 1/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 18                         | Cuaderno de obra: Cuando el cuaderno de obra no se encuentre en forma permanente en la obra o sea retenido por el contratista (se probará con informe de la supervisión o inspección).   | 2/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 19                         | Entrega de información: Cuando el contratista entregue documentación incompleta y/o falsa perjudicando en trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos y otros), La multa será por cada trámite documentario.  | 2/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 20                         | Planos post construcción, metrados finales, ensayos de control de calidad y protocolo de pruebas: Cuando el contratista no presente al ingeniero supervisor o inspector, según corresponda, los planos post construcción, metrados finales, ensayos de control de calidad y protocolo de pruebas; en un plazo de diez (10) días calendario de comunicado el término de obra. | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG                             |
| 21                         | Incumplimiento de pago a proveedoría local y mano de obra no calificada y calificada debidamente sustentado.   | 3/1000 del monto del contrato original, por cada día de retraso | Según informe de ingeniero inspector y/o ingeniero supervisor y/o monitor y/o Relaciones Comunitarias de AFSLG, con V°B° del Coordinador de Proyectos de la AFSLG |



NOTAS:

Calle Comercio N° 365 – Querocoto

18

ASOCIACION FONDO SOCIAL LA GRANJA  
Ing. GLENHYS DWIGHT BAZAN ALIAGA  
COORDINADOR DE PROYECTOS

1. La penalidad será descontada según lo dispuesto en Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Asociación Fondo Social La Granja vigente.
2. Para la aplicación de penalidades, el Supervisor elaborará un informe técnico donde se detallará el tipo de falta cometida, según lo establecido en la "Tabla de Penalidades". Dicho informe estará aprobado por parte de la Coordinación de Proyectos, el mismo que se comunicará oportunamente vía carta simple al consultor por el área de logística y contrataciones
3. La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las penalidades respectivas, harán acreedor al contratista de lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de la Asociación Fondo Social La Granja vigente.
4. El Contratista deberá poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.
5. La no suscripción del contrato no exime a la aplicación de las penalidades anteriormente indicadas

#### 39. NORMAS ANTICORRUPCIÓN

El contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, El contratista se obliga a no ejecutar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o empleado o cualquier tercer relacionado con la adquisición aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial el proveedor declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales con la AFSLG, constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Compra y/o Orden de Servicio de las que esta los términos de referencia forman parte integrante.

#### 40. NORMAS ANTISOBORNO

El contratista no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o personas vinculadas.

Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

También, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la AFSLG.

De la misma manera, el contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la organización pueda accionar.

#### 41. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma a terceros, cualquier información estrictamente confidencial que hubiese recibido directa o indirectamente del AFSLG o que hubiese sido generada como parte del Servicio.



El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de la orden de servicio o contrato respectivo, y de ser el caso, la AFSLG se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan

